


**Beschreibung des ausgeführten Bauvorhabens:**

**Krafthaus und Wehranlage KW Gösnitzbach**

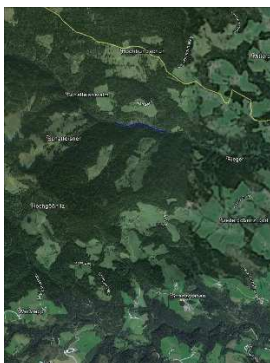

Auftraggeber:	<b>Ökopark Lorder GmbH</b>
Anschrift:	<b>8591 Maria Lankowitz, Puchbach 114</b>
Ansprechperson des AG:	<b>GF Gerald Berger</b>
Planung :	<b>InterTechno Engineering GmbH</b>
Örtliche Bauaufsicht:	<b>InterTechno Engineering GmbH</b>
Baubeginn:	<b>Juni 2015</b>
Bauende:	<b>Oktober 2015</b>
Sparte:	<b>Beton- und Ingenieurbau</b>

**Beschreibung des Bauvorhabens:**

Es wurden die gesamten Erd.- Tief.- und Betonbauarbeiten für die Errichtung der gesamten Kraftwerksanlage für die Ökopark Lorder GmbH ausgeführt. Die Wehranlage wurde als Tirolerwehr mit Sandfang ausgebildet. Das Krafthaus wurde in Stahlbeton ausgeführt. Es wurden gemäß Ökologie 2 Fischtreppen hergestellt.

**Technische Kenndaten:**

Ca. 800 m<sup>3</sup> Erdbewegung, Baugrubenaushub  
 Ca. 50 m<sup>2</sup> Steinbauarbeiten  
 Ca. 500 m<sup>3</sup> Stahlbetonarbeiten
